

Västra Ryds kyrka

Antikvarisk medverkan vid renovering av södra bogårdsmuren, Västra Ryds kyrka, Västra Ryds socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

Lisa Sundström
Rapport 2010:11



Västra Ryds kyrka

Antikvarisk medverkan vid renovering av södra bogårdsmuren, Västra Ryds kyrka, Västra Ryds socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

Lisa Sundström
Rapport 2010:11

Omslagsbild: Del av södra bogårdsmuren, Västra Ryds kyrka, Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20100126

Rapporten finns i PDF-format på adressen stockholms.lans.museum



Sickla Industriväg 5B, 131 34 Nacka
Tel 08-586 194 00 Fax 08-32 32 72
Webb: stockholms.lans.museum

© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

Nacka 2010

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	7
Administrativa uppgifter	7
Byggnadshistorik med relevans för ärendet.....	7
Utförda åtgärder.....	8
Avvikelser från arbetshandlingar.....	11
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder.....	11

Sammanfattning av utförda åtgärder

Arbetet har bestått i renovering av en delar av den södra bogårdsmuren vid Västra Ryds kyrka.

Administrativa uppgifter

Objekt: Västra Ryds kyrka

Socken: Västra Ryd

Kommun: Upplands-Bro

Landskap: Uppland

Arbetshandlingar: Vårdplan, Västra Ryds kyrkogård, Inventering hösten 2006

Länsstyrelsens beslut: 433-09-20838

Byggherre/beställare: Kungsängen-Västra Ryds församling

Entreprenörer: SH Bygg, sten och anläggning AB

Antikvariskt medverkande: Stockholms läns museum, Niss Maria Legars/
slutbesiktning Stockholms läns museum, Lisa Sundström


Byggnadstid: maj 2009 – april 2010

Antikvarisk slutbesiktning: 2010-05-03

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Bogårdsmuren kring Västra Ryds kyrka är en kallmurad grästensmur uppförd 1771-72 då även de två stigluckorna på vardera sidan om västtornet byggdes. Kyrkogården utvidades under 1870-talet österut.

Utförda åtgärder

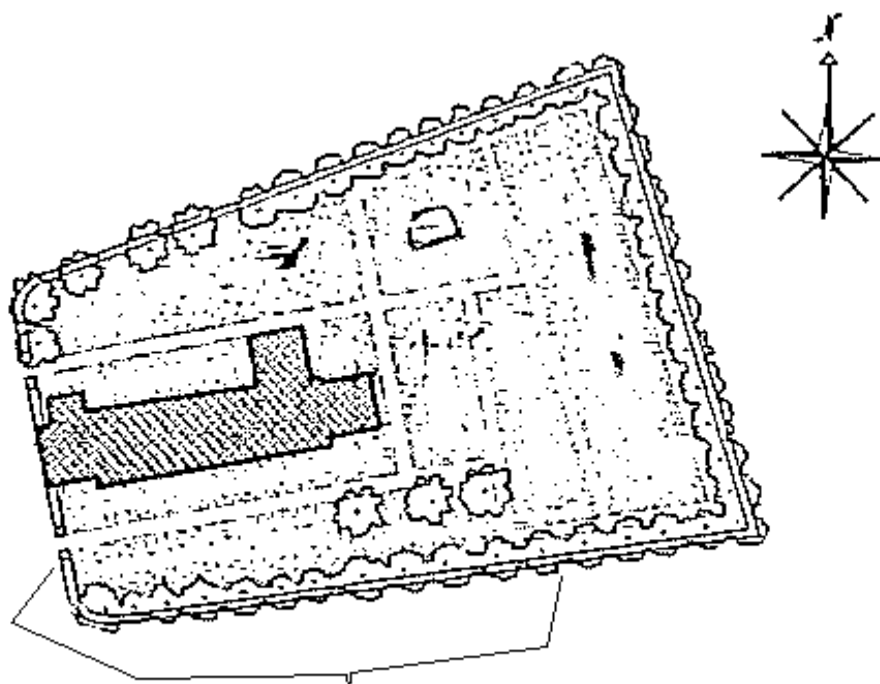

Del av den södra bogårdsmuren som har renoverats.

Situationsplan utvisande den del av bogårdsmuren som har renoverats.

Delar av den södra bogårdsmurens stenar hade börjat bukta ut med rasrisk som följd samt kilstenar saknades på flera ställen.

Lös sten har lagts om på de ställen där stenen buktat ut samt kompletterats med kilsten. Murens beväxtlighet av sedum har på omlagda delar lyfts av och därefter återlagts.



Den södra muren före renovering. Foto: Niss Maria Legars. Bildnr: lp20100127.



Den södra muren före renovering. Renovering utfördes fram till den stora stenen lagd på muren. Efter avslutade arbeten togs stenen bort. Foto: Niss Maria Legars. Bildnr: lp20100128.



Den södra muren efter partiell omläggning. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20100129.



Södra bogårdsmuren efter partiell omläggning. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20100130.



Den södra bogårdsmurens insida efter partiell omläggning. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20100131.

Avvikelser från arbetshandlingar

Några projekteringshandlingar har inte erhållits inför arbetets utförande.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Omläggningen av bogårdsmuren har i övrigt utförts i enlighet med vårdplan och är väl utfört.
